
Informacija apie 2022–2030 m. Tauragės RPPl įgyvendinimą 2026 m. rugsėjis

Jurgita Choromanskytė

Tauragės regiono plėtros tarybos administracijos direktorė

Informacija parengta vadovaujantis 2026-10-10 INVESTIS prieinamais projektų duomenimis, taip pat CPVA teikiama informacija apie projektams išmokėtas lėšas iki 2026-10-10.

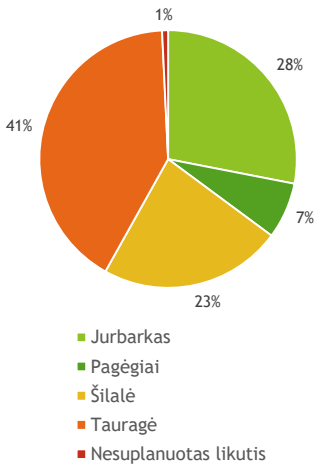

Europos Sąjungos lėšos skirtos Tauragės regionui

- Regiono limitas – 115 855 697,00 Eur
- Regiono plėtros plane (RPPl) suplanuota – 114 979 940,19 Eur (99,24% nuo limito)
- Nesuplanuotas likutis – 875 756,81 Eur (0,76% nuo limito)

NUTRAUKTOS SUTARTYS

Projekto Nr.	Savivaldybė	Projekto pavadinimas	Sutartis ES	Nutraukimo data
27-005-P-0003	Pagėgiai	Naujų ikimokyklinio ugdymo vietų kūrimas Pagėgių savivaldybėje	698 725,00	2026-03
27-005-P-0001	Šilalė	Naujų ikimokyklinio ugdymo vietų kūrimas Šilalės rajono savivaldybėje	90 155,00	2026-03
27-405-P-0001	Pagėgiai	Socialinio būsto fondo plėtra Pagėgių savivaldybėje	1 325 229,33	2026-09

IŠ RPPL IŠBRAUKTI PROJEKTAI

Projektas	Savivaldybė	Sutartis ES	Išbraukimo data
Elektriniai autobusai	Tauragė	700 000,00	2026-09
Įkrovimo infrastruktūra	Tauragė	70 000,00	2026-09

2022–2030 METŲ REGIONŲ PLĖTROS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS PLANAS

ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų, dėl kurių sudarytos RPPl pažangos priemonėms įgyvendinti skirtų projektų finansavimo sutartys, dalis nuo regionui RPP preliminariai numatytų ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų, proc. kaupiamuoju būdu						
2024 m.	2025 m.	2026 m.	2027 m.	2028 m.	2029 m.	2030 m.
30	78	100	100	100	100	-

ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų, kurios išmokėtos RPPl pažangos priemonėms įgyvendinti skirtų projektų vykdytojams, dalis nuo regionui RPP preliminariai numatytų ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų, proc. kaupiamuoju būdu						
2024 m.	2025 m.	2026 m.	2027 m.	2028 m.	2029 m.	2030 m.
2	12	39	65	88	100	-

Vadovaujantis Regionų programos įgyvendinimo planu, 2026 m. pabaigoje turi būti pasirašytos visos projektų sutartys, o išmokėtos lėšos turi siekti 39 proc. nuo Regionų plėtros programoje numatytos sumos.

Pateikta PĮP 2026-10-10

Regionas	Limitas (Eur)	ES lėšos (Eur)	% nuo limito
VIL	244 406 983,00	291 000 235,65	119%
ALY	136 924 543,00	129 993 914,65	95%
TEL	103 528 095,00	94 676 894,91	91%
PAN	179 647 455,00	164 045 394,77	91%
UTE	148 283 149,00	135 285 484,20	91%
TAU	115 855 697,00	104 946 026,66	91%
ŠIA	196 024 182,00	176 484 085,72	90%
KLA	219 862 624,00	197 428 138,36	90%
KAU	289 012 808,00	259 079 151,97	90%
MAR	142 400 665,00	124 571 756,18	87%

Skirtas finansavimas 2026-10-10

Regionas	Limitas (Eur)	ES lėšos (Eur)	% nuo limito
VIL	244 406 983,00	228 620 656,42	94%
TAU	115 855 697,00	104 946 026,66	91%
ALY	136 924 543,00	120 343 016,14	88%
KAU	289 012 808,00	249 433 909,54	86%
MAR	142 400 665,00	117 098 326,92	82%
KLA	219 862 624,00	179 781 209,88	82%
ŠIA	196 024 182,00	158 558 105,80	81%
PAN	179 647 455,00	138 554 406,29	77%
TEL	103 528 095,00	76 617 166,74	74%
UTE	148 283 149,00	109 561 087,12	74%

Pasirašyta sutarčių 2026-10-10

Regionas	Limitas (Eur)	ES lėšos (Eur)	% nuo limito
TAU	115 855 697,00	104 946 026,66	91%
VIL	244 406 983,00	220 455 876,87	90%
ALY	136 924 543,00	120 343 016,14	88%
KAU	289 012 808,00	241 795 249,96	84%
MAR	142 400 665,00	116 298 326,92	82%
ŠIA	196 024 182,00	157 858 105,80	81%
KLA	219 862 624,00	177 047 138,54	81%
UTE	148 283 149,00	109 561 087,12	74%
TEL	103 528 095,00	76 221 194,74	74%
PAN	179 647 455,00	131 233 919,49	73%

Išmokėta ES lėšų 2026-10-10

Regionas	Limitas (Eur)	ES lėšos (Eur)	% nuo limito
ALY	136 924 543,00	35 693 597,25	26,1%
ŠIA	196 024 182,00	44 377 276,66	22,6%
KAU	289 012 808,00	61 262 064,59	21,2%
KLA	219 862 624,00	43 005 129,01	19,6%
TAU	115 855 697,00	21 960 297,69	19,0%
UTE	148 283 149,00	24 889 000,72	16,8%
MAR	142 400 665,00	19 658 361,74	13,8%
VIL	244 406 983,00	28 832 297,75	11,8%
TEL	103 528 095,00	7 356 124,22	7,1%
PAN	179 647 455,00	11 978 512,69	6,7%

BAIGTI PROJEKTAI 2026-10-10				
Regionas	Limitas	Baigtų projektų skaičius	Išmokėta ES lėšų (Eur)	Išmokėta (% nuo limito)
TAU	115 855 697,00	4,00	4 040 605,77	3,49%
UTE	148 283 149,00	7,00	1 204 860,61	0,81%
MAR	142 400 665,00	3,00	907 504,62	0,64%
VIL	244 406 983,00	3,00	1 292 933,48	0,53%
KLA	219 862 624,00	6,00	874 763,58	0,40%
ŠIA	196 024 182,00	4,00	446 847,10	0,23%
TEL	103 528 095,00	3,00	186 488,78	0,18%
PAN	179 647 455,00	2,00	184 765,56	0,10%
KAU	289 012 808,00	1,00	57 247,96	0,02%
ALY	136 924 543,00	0,00		0,00%


Projekto Nr.	Savivaldybė	Projekto pavadinimas	Išmokėta ES lėšų	Baigimo data
27-537-P-0002	Pagėgiai	Ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtra Pagėgių savivaldybėje	48 191,90	2026-02
27-206-P-0001	Jurbarkas	Jurbarko rajono savivaldybės aplinkos oro monitoringo infrastruktūros plėtra ir visuomenės informavimas	113 654,23	2026-03
27-310-P-0001	Tauragė	Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos infrastruktūros ir aplinkinės teritorijos funkcionalumo didinimas“	1 833 793,66	2025-10
27-308-P-0001	Tauragė	Viešųjų paslaugų prieinamumo gerinimas Tauragės vaikų reabilitacijos centre - mokykloje „Pušelė“ ir Tauragės meno mokykloje	2 044 965,98	2026-06

Atitiktis Regionų plėtros programos įgyvendinimo priežiūros planui

Kriterijus	Planas 2026-12-31	Pasiekta 2026-09-10
Nuo Regionų plėtros programos įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos regiono plėtros plane suplanuotų ES ir kitos tarptautinės paramos lėšų dalis nuo Regionų plėtros programoje regionui numatytų lėšų (proc.)	100,00%	99,24%
Nuo Regionų plėtros programos įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos skirtų ES ir kitos tarptautinės paramos lėšų dalis pagal sudarytas sutartis nuo Regionų plėtros programoje regionui numatytų lėšų (proc.)	100,00%	90,60%
Nuo Regionų plėtros programos įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos išmokėtų ES ir kitos tarptautinės paramos lėšų dalis nuo Regionų plėtros programoje regionui numatytų lėšų (proc.)	39,00%	19,00%

Tauragės RPPI įgyvendinimo suvestinė pagal savivaldybes

Savivaldybė	RPPI ES	PĮP ES	Pateikta PĮP nuo suplanuotų	Sutartis ES	Pasirašyta sutarčių nuo suplanuotų	Išmokėta ES	Išmokėta ES lėšų nuo suplanuotų	Sutaupymai projektuose
Jurbarkas	19 232 386,55	17 016 699,17	88,48%	17 016 699,17	88,48%	⇧2 178 026,96	⇧11,32%	69 168,09
Pagėgiai	5 935 552,71	⇩4 019 605,86	⇩67,72%	⇩4 019 605,86	⇩67,72%	⇧1 689 152,62	⇧28,46%	⇧1 327 007,95
Šilalė	22 107 988,64	20 260 930,56	91,65 %	20 260 930,56	91,65%	⇧2 922 692,47	⇧13,22%	101 866,08
Tauragė	43 060 118,11	39 024 711,18	90,63%	39 024 711,18	90,63%	⇧13 154 602,23	⇧30,55 %	795 180,96
Bendri projektai	24 643 894,18	24 624 079,89	99,92 %	24 624 079,89	99,92%	⇧2 015 823,41	⇧8,18 %	19 814,28



2026 m. rugsėjo mėnesį:
Nutraukta 1 sutartis – 1 325 229,33 Eur ES lėšų (2026-09-17).
Projektams išmokėta **2 647 606,88** Eur ES lėšų, iš jų:
Jurbarko r. sav.:
Išmokėta 3 PĮP – 262 828,23 Eur;
Pagėgių sav.:
Išmokėta 3 PĮP – 397 184,88 Eur
Šilalės r. sav.:
Išmokėta 4 PĮP – 1 018 848,42 Eur;
Tauragės r. sav.:
Išmokėta 3 PĮP – 961 043,84 Eur;
Bendri regiono projektai:
Išmokėta 1 PĮP – 7 701,51 Eur.

Švietimo pažangos priemonės (ŠMSM) įgyvendinimas

Pažangos priemonė	Projektų skaičius	RPPl ES	PĮP ES	Sutartis ES	Išmokėtos lėšos
Švietimo PP	**8**	**4 004 186,00**	**4 004 159,81**	**4 004 159,81**	**2 281 282,21**
Jurbarkas - Ikimokyklinės		411 255,00	411 254,07	411 254,07	362 218,22
Jurbarkas - Universalus dizainas		725 280,00	725 275,00	725 275,00	578 349,68
Pagėgiai - Transporto priemonės		637 500,00	637 500,00	637 500,00	495 018,81
Pagėgiai - Visos dienos mokykla		85 385,00	85 385,00	85 385,00	69 199,33
Šilalė - Universalus dizainas		162 175,00	162 175,00	162 175,00	33 413,00
Šilalė - Visos dienos mokykla		1 688 644,00	1 688 644,00	1 688 644,00	506 593,00
Tauragė - Transporto priemonės		190 213,00	190 193,04	190 193,04	159 314,64
Tauragė - Universalus dizainas		103 734,00	103 733,70	103 733,70	53 017,19

Išmokėta 693 604,68 Eur ES lėšų, iš jų:
Jurbarkas – Ikimokyklinės – 140 000,00 Eur;
Jurbarkas – Universalus dizainas – 120 216,68Eur;
Šilalė – Visos dienos mokykla – 433 388,00 Eur.

Funkcinės zonos pažangos priemonės (VRM) įgyvendinimas

Pažangos priemonė	Projektų skaičius	RPPĮ ES	PĮP ES	Sutartis ES	Išmokėtos lėšos
Tauragė+ funkcinės zonos PP	**18**	**41 581 305,79**	**41 561 437,27**	**40 190 469,27**	**5 596 695,20**
Jurbarkas - Turizmas (Varlaukio (Lybiškių) geležinkelio stotis; Kraštovaizdžio parkas Mituvos upės slėnyje)		488 376,00	488 376,00	488 376,00	474 925,19
Jurbarkas - Turizmas (Kalnėnų karjeras) (2026 III)		1 700 000,00	1 700 000,00		
Jurbarkas - Turizmas (Kraštovaizdžio parkas ir Mituvos upės II etapas)		1 105 000,00	1 105 000,00	1 104 999,98	
Jurbarkas - Turizmas (Nemuno, Mituvos ir Imsrės upių pritaikymas lankymui)		4 165 000,55	4 164 988,05	4 164 988,05	
Jurbarkas - Turizmas (Raudonės pilis ir parkas, Smalininkų geležinkelio stotis ir vandens matavimo stotis)		1 487 500,00	1 487 500,00	1 487 499,86	
Jurbarkas ir Pagėgiai - VSB*		505 750,00	505 750,00	505 750,00	73 441,39
Pagėgiai - Turizmas (Raganų eglė, Vilkyškių apžvalgos bokštas, Būbliškės piliakalnis)		397 517,76	397 517,76	397 517,76	355 110,61
Pagėgiai - Turizmas (Užlenkio ežeras)		1 361 841,30	1 361 799,73	1 361 799,73	
Regionas - Nuotekų dumblas		12 333 680,00	12 333 680,00	12 333 680,00	172 715,68
Regionas - Skatinimo priemonės investuoti (ŽR)**		5 300 120,00	5 280 305,71	5 280 305,71	855 939,51
Regionas - Skatinimo priemonės judėti (autobusų stotelės) (ŽR)		1 924 920,00	1 924 920,00	1 924 920,00	474 328,02
Regionas - Skatinimo priemonės keliauti (ŽR)***		1 368 421,00	1 358 564,18	1 358 564,18	272 860,90
Šilalė - Turizmas (Pakisio piliakalnis, Aukuro akmuo, Paršežerio ežeras ir Kulgrinda, Padievaičio piliakalnis)		1 389 227,00	1 389 227,00	1 389 227,00	574 863,52
Šilalė - Turizmas (Kvėdarnos tvenkinys)		750 000,00	750 000,00	750 000,00	82 181,42
Šilalė - Turizmas (Pilių piliakalnis Kaltinėnuose)		750 000,00	750 000,00	750 000,00	101 658,72
Šilalė - Turizmas (Šilalės tvenkinys ir pušynas)		3 731 846,00	3 731 846,00	3 731 846,00	285 229,39
Tauragė - Turizmas (Balskai)		501 319,00	501 319,00	501 319,00	28 000,00
Tauragė - Turizmas (Draudeniai)		2 330 644,00	2 330 644,00	2 330 644,00	2 213 434,69

Išmokėta 296 923,72 Eur ES lėšų, iš jų:
Jurbarkas – Turizmas (Varlaukio (Lybiškių) geležinkelio stotis; Kraštovaizdžio parkas Mituvos upės slėnyje) – **2 611,55** Eur;
Pagėgiai – Turizmas (Raganų eglė, Vilkyškių apžvalgos bokštas, Būbliškės piliakalnis) – **99 077,55** Eur;
Šilalė – Turizmas (Šilalės tvenkinys ir pušynas) – **187 533,11** Eur;
Regionas – Skatinimo priemonės judėti (autobusų stotelės) – **7 701,51** Eur.

Regionas - Skatinimo priemonės investuoti (ŽR)** – projektu įgyvendinamos 2 veiklos:
1 – infrastruktūros plėtra Jurbarko mieste (Jurbarko r. sav.) – ES lėšos sutartyje 5 111 457,69 Eur, išmokėtos ES lėšos – 775 730,94 Eur;
2 – skatinimo investuoti priemonės („Žaliasis regionas“) – ES lėšos sutartyje 168 848,02 Eur, išmokėtos ES lėšos – 80 208,57 Eur.

Regionas - Skatinimo priemonės keliauti (ŽR)*** – projektu įgyvendinamos 3 veiklos:
1 – Skatinimo priemonių keliauti Tauragės regione parengimas („Žaliasis regionas“) – ES lėšos sutartyje 170 187,51 Eur, išmokėtos ES lėšos – 168 165,56 Eur;
2 – Veliuonos turizmo informacijos centro įrengimas (Jurbarko r. sav.) – ES lėšos sutartyje 945 916,12 Eur, išmokėtos ES lėšos – 0 Eur;
3 – Turistinių vartų į Tauragės regioną įrengimas (Tauragės r. sav.) – ES lėšos sutartyje 242 460,55 Eur, išmokėtos ES lėšos – 104 695,34 Eur.

Tauragės miesto: tvarios plėtros (VRM) ir darnaus judumo (SM) pažangos priemonių įgyvendinimas

Pažangos priemonė	Projektų skaičius	RPPl ES	PĮP ES	Sutartis ES	Išmokėtos lėšos
Darnaus judumo skatinimo Tauragės mieste PP	**2**	**6 329 108,00**	**6 329 108,00**	**6 329 108,00**	**3 120 000,00**
Dviračių takai		5 785 484,00	5 785 484,00	5 785 484,00	3 000 000,00
Autobusų stotelės		543 624,00	543 624,00	543 624,00	120 000,00
Tauragės miesto tvarios plėtros PP	**5**	**16 603 033,75**	**16 603 033,75**	**16 603 033,75**	**5 487 815,96**
Jūros upės pakrantė		2 898 225,00	2 898 225,00	2 898 225,00	
„Šaltinio“ progimnazija (BAIGTAS ĮGYVENDINTI)		1 833 793,67	1 833 793,67	1 833 793,67	1 833 793,66
Jovarų pagrindinė mokykla		5 808 219,75	5 808 219,75	5 808 219,75	106 200,55
Tvarios aplinkos užtikrinimas prie Martyno Mažvydo progimnazijos, urbanizuotose ir tankiai apgyvendintose, Zumpės tvenkinių teritorijose		4 017 829,33	4 017 829,33	4 017 829,33	1 502 855,77
„Pušelė“ ir Tauragės meno mokykla (BAIGTAS ĮGYVENDINTI)		2 044 966,00	2 044 966,00	2 044 966,00	2 044 965,98

Aplinkos ministerijos pažangos priemonių (AM) įgyvendinimas

Pažangos priemonė ir projektai	Projektų skaičius	RPPI ES	PĮP ES	Sutartis ES	Išmokėtos lėšos
Aplinkos oro monitoringo stiprinimo PP	**2**	**510 000,00**	**434 903,17**	**434 903,17**	**402 528,15**
Jurbarkas (BAIGTAS ĮGYVENDINTI)		170 000,00	117 246,94	117 246,94	113 654,23
Tauragė		340 000,00	317 656,23	317 656,23	288 873,92
Atliekų rūšiuojamojo surinkimo skatinimo PP	**1**	**2 891 828,00**	**2 891 828,00**	**2 891 828,00**	**534 531,75**
TRATC		2 891 828,00	2 891 828,00	2 891 828,00	534 531,75
Praeityje pažeistų teritorijų sutvarkymo PP	**1**	**592 920,00**	**580 116,27**	**580 116,27**	**436 688,47**
Jurbarkas		592 920,00	580 116,27	580 116,27	436 688,47
Vandentvarkos paslaugų prieinamumo didinimo PP	**4**	**8 889 419,90**	**8 889 419,90**	**8 889 419,90**	**1 798 747,77**
Jurbarkas		549 524,00	549 524,00	549 524,00	7 087,41
Pagėgiai		1 194 223,62	1 194 223,62	1 194 223,62	524 741,46
Šilalė		2 612 618,28	2 612 618,28	2 612 618,28	390 068,42
Tauragė		4 533 054,00	4 533 054,00	4 533 054,00	876 850,48
Žaliosios infrastruktūros plėtojimo PP	**3**	**3 300 379,11**	**3 300 379,11**	**3 300 379,11**	**160 964,63**
Jurbarkas		1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
Tauragė		1 445 000,00	1 445 000,00	1 445 000,00	160 964,63
Šilalė		155 379,11	155 379,11	155 379,11	

Išmokėta 1 183 486,12 Eur ES lėšų:
Pagėgiai – Vandentvarkos paslaugų prieinamumo didinimo projektui – **283 999,89** Eur;
Šilalė – Vandentvarkos paslaugų prieinamumo didinimo projektui **– 31 432,31** Eur;
Tauragė – Vandentvarkos paslaugų prieinamumo didinimo projektui – **868 053,92** Eur.

Sveikatos apsaugos ministerijos pažangos priemonių (SAM) įgyvendinimas

Pažangos priemonė	Projektų skaičius	RPPI ES	PĮP ES	Sutartis ES	Išmokėtos lėšos
Ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtros pažangos priemonė	**3**	**3 672 638,00**	**3 669 821,10**	**3 669 821,10**	**284 826,43**
Jurbarkas		3 334 993,00	3 334 993,00	3 334 993,00	
Pagėgiai (BAIGTAS ĮGYVENDINTI)		49 920,00	49 920,00	49 920,00	48 191,90
Tauragė		287 725,00	284 908,10	284 908,10	236 634,53
Kokybiškų visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumo didinimo PP	**3**	**669 032,00**	**669 032,00**	**669 032,00**	**325 093,89**
Šilalė		170 000,00	170 000,00	170 000,00	154 986,35
Tauragė		170 000,00	170 000,00	170 000,00	145 802,89
Jurbarkas ir Pagėgiai		329 032,00	329 032,00	329 032,00	24 304,65

Išmokėta 1 818,49 Eur ES lėšų Tauragės – Ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtros projektui.

Socialinės ir darbo apsaugos ministerijos pažangos priemonės (SADM) įgyvendinimas

Pažangos priemonė	Projektų skaičius	RPPI ES	PĮP ES	Sutartis ES	Išmokėtos lėšos
Socialinio būsto ir socialinių paslaugų PP	**12**	**17 439 892,64**	**17 338 017,61**	**17 338 017,61**	**11 555 427,88**
Jurbarkas - socialinis ir apsaugotas būstas		652 426,00	652 426,00	652 426,00	**205 103,76**
Pagėgiai - Apsaugotas būstas		85 000,00	84 991,05	84 991,05	62 808,11
Pagėgiai - Socialinis būstas (NUTRAUKTA SUTARTIS)		1 325 229,33	1 325 229,33	1 325 229,33	
Pagėgiai - Socialinės paslaugos		208 268,70	208 268,70	208 268,70	62 480,61
Šilalė - Apsaugotas būstas		127 500,00	127 500,00	127 500,00	85 998,75
Šilalė - Socialinis būstas ir socialinės paslaugos		5 325 407,25	5 325 407,25	5 325 407,25	248 264,46
Šilalė - Socialinių paslaugų įstaigų senyvo amžiaus asmenims modernizavimas ir plėtra		3 500 000,00	3 398 133,92	3 398 133,92	437 664,00
Tauragė - Nestacionarios socialinės paslaugos		452 081,31	452 081,31	452 081,31	
Tauragė - Socialinis būstas		2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	291 171,43
Tauragė - Apsaugotas būstas		432 950,77	432 950,77	432 950,77	22 721,87
Tauragė - Grupinio gyvenimo namai		284 960,93	284 960,93	284 960,93	
Tauragė - Socialinių paslaugų įstaigų senyvo amžiaus asmenims modernizavimas ir plėtra		2 496 068,35	2 496 068,35	2 496 068,35	70 000,00

Išmokėta 471 773,87 Eur ES lėšų, iš jų:
Pagėgiai – Apsaugotas būstas – **14 107,44** Eur;
Šilalė - Socialinių paslaugų įstaigų senyvo amžiaus asmenims modernizavimas ir plėtra – **366 495,00** Eur;
Tauragė – Socialinis būstas – **91 171,43** Eur.

Pagėgiai - Socialinis būstas (NUTRAUKTA SUTARTIS)



Projekto Nr.	PP	Projekto pavadinimas	RPPI ES	Sutartis ES	Išmokėta ES	Sutaupymai projektuose
		Jurbarkas iš viso:	**19 232 386,55**	**17 016 699,17**	**12 178 026,96**	**69 168,09**
27-206-P-0001	Aplinkos oro monitoringo stiprinimo PP	Jurbarko rajono savivaldybės aplinkos oro monitoringo infrastruktūros plėtra ir visuomenės informavimas *(Baigtas įgyvendinti projektas)*	170 000,00	117 246,94	113 654,23	56 354,77
27-538-P-0001	Ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtros PP	Ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtra	3 334 993,00	3 334 993,00		
27-201-P-0001	Praeityje pažeistų teritorijų sutvarkymo PP	Praeityje pažeistos teritorijos Jurbarko mieste sutvarkymas	592 920,00	580 116,27	436 688,47	12 803,73
27-403-P-0001	Socialinio būsto ir socialinių paslaugų PP	Socialinio būsto fondo ir apsaugoto būsto paslaugų plėtra Jurbarko rajono savivaldybėje	652 426,00	652 426,00	205 103,76	
27-003-P-0001	Švietimo PP	Universalaus dizaino elementų ir kitų inžinerinių priemonių įrengimas Jurbarko rajono savivaldybės BUM bei visos dienos mokyklos erdvių sukūrimas ir pritaikymas ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio bei pagrindinio ugdymo programas vykdančiose Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigose	725 280,00	725 275,00	578 349,68	5,00
27-004-P-0002	Švietimo PP	Naujų ikimokyklinio ugdymo vietų kūrimas Jurbarko rajono savivaldybėje	411 255,00	411 254,07	362 218,22	0,93
27-302-P-0001	Tauragė+ funkcinės zonos PP	Gamtos ir kultūros objektų pritaikymas lankymui Jurbarko rajono savivaldybėje (Varlaukio (Lybiškių) geležinkelio stoties pritaikymas lankymui; Kraštovaizdžio parko Mituvos upės slėnyje pritaikymas lankymui)	488 376,00	488 376,00	474 925,19	
27-319-P-0001	Tauragė+ funkcinės zonos PP	Kraštovaizdžio parko ir Mituvos upės pritaikymo lankymui II etapas (2026)	1 105 000,00	1 104 999,98		0,02
27-316-P-0001	Tauragė+ funkcinės zonos PP	Raudonės pilies ir parko, Smalininkų geležinkelio stoties ir vandens matavimo stoties pritaikymas lankymui	1 487 500,00	1 487 499,86		0,14
27-320-P-0001	Tauragė+ funkcinės zonos PP	Nemuno, Mituvos ir Imsrės upių pritaikymas lankymui Jurbarko mieste	4 165 000,55	4 164 988,05		12,50
27-321-P-0001	Tauragė+ funkcinės zonos PP	Kalnėnų karjero pritaikymas lankymui (2026)	1 700 000,00	1 700 000,00		
27-202-P-0001	Vandentvarkos paslaugų prieinamumo didinimo PP	Vandentvarkos paslaugų prieinamumo didinimas Jurbarko rajono savivaldybėje	549 524,00	549 524,00	7 087,41	
27-209-P-0001	Žaliosios infrastruktūros plėtojimo PP	Jurbarko miesto žaliosios infrastruktūros plėtojimas	1 700 000,00	1 700 000,00		
	Civilinės parengties stiprinimo PP	Civilinės parengties stiprinimas Jurbarko rajone	575 112,00			
	Geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros saugumo didinimo PP	Geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros saugumo didinimas Jurbarko rajone	1 575 000,00			

Išmokėta 262 828,23 Eur ES lėšų projektams:

- „Universalaus dizaino elementų ir kitų inžinerinių priemonių įrengimas Jurbarko rajono savivaldybės BUM bei visos dienos mokyklos erdvių sukūrimas ir pritaikymas ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio bei pagrindinio ugdymo programas vykdančiose Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigose“ – **120 216,68** Eur;
- „Naujų ikimokyklinio ugdymo vietų kūrimas Jurbarko rajono savivaldybėje“ – **140 000,00** Eur;
- „Gamtos ir kultūros objektų pritaikymas lankymui Jurbarko rajono savivaldybėje (Varlaukio (Lybiškių) geležinkelio stoties pritaikymas lankymui;

Kraštovaizdžio parko Mituvos upės slėnyje pritaikymas lankymui) - **2 611,55** Eur.

Jurbarkas ir Pagėgiai – VSB* – informacija apie projektu įgyvendinamą veiklą, finansuojamą ERPF lėšomis. Informacija apie projekto veiklą, finansuojamą ESF+ lėšomis pateikta 11 skaidrėje (SAM PP).

Regionas - Skatinimo priemonės investuoti (ŽR)** – projektu įgyvendinamos 2 veiklos:
1 – infrastruktūros plėtra Jurbarko mieste (Jurbarko r. sav.) – ES lėšos sutartyje 5 111 457,69 Eur, išmokėtos ES lėšos – 775 730,94 Eur;
2 – skatinimo investuoti priemonės („Žaliasis regionas“) – ES lėšos sutartyje 168 848,02 Eur, išmokėtos ES lėšos – 80 208,57 Eur.

Regionas - Skatinimo priemonės keliauti (ŽR)*** – projektu įgyvendinamos 3 veiklos:
1 – Skatinimo priemonių keliauti Tauragės regione parengimas („Žaliasis regionas“) – ES lėšos sutartyje 170 187,51 Eur, išmokėtos ES lėšos – 168 165,56 Eur;
2 – Veliuonos turizmo informacijos centro įrengimas (Jurbarko r. sav.) – ES lėšos sutartyje 945 916,12 Eur, išmokėtos ES lėšos – 0 Eur;
3 – Turistinių vartų į Tauragės regioną įrengimas (Tauragės r. sav.) – ES lėšos sutartyje 242 460,55 Eur, išmokėtos ES lėšos – 104 695,34 Eur.

Pagėgių savivaldybės projektai

Projekto Nr.	PP	Projekto pavadinimas	RPPI ES	Sutartis ES	Išmokėta ES	Sutaupymai projektuose
		Pagėgiai iš viso:	5 935 552,71	4 019 605,86	1 689 152,62	1 327 007,95
27-537-P-0002	Ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtros PP	Ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtra	49 920,00	49 920,00	48 191,9	1 728,10
~~27-405-P-0001~~	~~Socialinio būsto ir socialinių paslaugų PP~~	~~Socialinio būsto fondo plėtra Pagėgių savivaldybėje~~	~~1 325 229,33~~	~~1 325 229,33~~		1 325 229,33
27-401-P-0001	Socialinio būsto ir socialinių paslaugų PP	Apsaugoto būsto paslaugų plėtra Pagėgių savivaldybėje	85 000,00	84 991,05	62 808,11	8,95
27-402-P-0001	Socialinio būsto ir socialinių paslaugų PP	Socialinių paslaugų plėtra Pagėgių savivaldybėje	208 268,70	208 268,70	131 695,50	
27-002-P-0001	Švietimo PP	Visos dienos mokyklos erdvių sukūrimas ir pritaikymas ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio bei pagrindinio ugdymo programas vykdančiose Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigose	85 385,00	85 385,00	71 586,23	
27-005-P-0002	Švietimo PP	Negalią turintiems mokiniams ir kitiems mokiniams pavėžėti iki ir iš ugdymo įstaigos lengvai pritaikomų transporto priemonių įsigijimas Pagėgių savivaldybėje	637 500,00	637 500,00	495 018,81	
27-303-P-0001	Tauragė+ funkcinės zonos PP	Gamtos ir kultūros objektų Pagėgių rajone pritaikymas lankymui bei turizmo informavimo paslaugų plėtra (Raganų eglės ir Vilkyškių apžvalgos bokšto pritaikymas lankymui; Būbliškės piliakalnio pritaikymas lankymui)	397 517,76	397 517,76	355 110,61	
27-313-P-0001	Tauragė+ funkcinės zonos PP	Užlenkio ežero (Panemunėje) pritaikymas lankymui	1 361 841,30	1 361 799,73		41,57
27-203-P-0001	Vandentvarkos paslaugų prieinamumo didinimo PP	Vandentvarkos paslaugų prieinamumo didinimas Pagėgių savivaldybėje	1 194 223,62	1 194 223,62	524 741,46	
	Geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros saugumo didinimo PP	Geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros saugumo didinimas Pagėgių savivaldybėje	590 667,00			

Išmokėta 397 184,88 Eur ES lėšų, iš jų:

- „Apsaugoto būsto paslaugų plėtra Pagėgių savivaldybėje“ – **14 107,44** Eur;
- „Gamtos ir kultūros objektų Pagėgių rajone pritaikymas lankymui bei turizmo informavimo paslaugų plėtra (Raganų eglės ir Vilkyškių apžvalgos bokšto pritaikymas lankymui;

Būbliškės piliakalnio pritaikymas lankymui)“ – **99 077,55** Eur;

- „Vandentvarkos paslaugų prieinamumo didinimas Pagėgių savivaldybėje“ – **283 999,89** Eur.

NUTRAUKTA projekto „Socialinio būsto fondo plėtra Pagėgių savivaldybėje“ SUTARTIS.

Šilalės rajono savivaldybės projektai

Projekto Nr.	PP	Projekto pavadinimas	RPPI ES	Sutartis ES	Išmokėta ES	Sutaupymai projektuose
		Šilalės projektai iš viso:	**22 107 988,64**	**20 260 930,56**	**2 922 692,47**	101 866,08
27-506-P-0001	Kokybiškų visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumo didinimo PP	Prevencinių priemonių, stiprinančių visuomenės sveikatą bei psichologinę gerovę ir atsparumą stiprinimas Šilalės rajono savivaldybėje	170 000,00	170 000,00	154 986,35	
27-406-P-0001	Socialinio būsto ir socialinių paslaugų PP	Socialinio būsto fondo ir socialinių paslaugų plėtra Šilalės rajono savivaldybėje	5 325 407,25	5 325 407,25	248 264,46	
27-401-P-0002	Socialinio būsto ir socialinių paslaugų PP	Apsaugoto būsto paslaugų plėtra Šilalės rajono savivaldybėje	127 500,00	127 500,00	85 998,75	
27-412-P-0001	Socialinio būsto ir socialinių paslaugų PP	Socialinių paslaugų įstaigų senyvo amžiaus asmenims infrastruktūros modernizavimas ir plėtra Šilalės rajono savivaldybėje	3 500 000,00	3 398 133,92	437 664,00	101 866,08
27-001-P-0001	Švietimo PP	Universalaus dizaino elementų ir kitų inžinerinių priemonių įrengimas Šilalės rajono savivaldybės BUM bei visos dienos mokyklos erdvių sukūrimas ir pritaikymas ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio bei pagrindinio ugdymo programas vykdančiose Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigose	162 175,00	162 175,00	55 184,44	
27-002-P-0002	Švietimo PP	Visos dienos mokyklos erdvių sukūrimas ir pritaikymas Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijoje	1 688 644,00	1 688 644,00	506 593,00	
27-304-P-0001	Tauragės funkcinės zonos PP	Gamtos ir kultūros objektų Šilalės rajone pritaikymas lankymui bei turizmo informavimo paslaugų plėtra (Pakisio piliakalnio ir Aukuro akmens pritaikymas lankymui; Paršežerio ežero ir Kulgrindos pritaikymas lankymui; Padievaičio piliakalnio pasiekiamumo gerinimas ir pritaikymas lankymui)	1 389 227,00	1 389 227,00	574 863,52	
27-318-P-0001	Tauragės funkcinės zonos PP	Šilalės tvenkinio ir Šilalės pušyno bei aplinkinių teritorijų pritaikymas lankymui	3 731 846,00	3 731 846,00	285 229,39	
27-314-P-0001	Tauragės funkcinės zonos PP	Kvėdarnos tvenkinio pritaikymas lankymui	750 000,00	750 000,00	82 181,42	
27-315-P-0001	Tauragės funkcinės zonos PP	Pilių piliakalnio Kaltinėnuose pritaikymas lankymui	750 000,00	750 000,00	101 658,72	
27-204-P-0001	Vandentvarkos paslaugų prieinamumo didinimo PP	Vandentvarkos paslaugų prieinamumo didinimas Šilalės rajono savivaldybėje	2 612 618,28	2 612 618,28	390 068,42	
27-210-P-0001	Žaliosios infrastruktūros plėtojimo PP	Šilalės miesto žaliosios infrastruktūros plėtojimas	155 379,11	155 379,11		
	Civilinės parengties stiprinimo PP	Civilinės parengties stiprinimas Šilalės rajone	1 145 192,00			
	Geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros saugumo didinimo PP	Geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros saugumo didinimas Šilalės rajone	600 000,00			

Išmokėta 1 018 848,42 Eur ES lėšų, iš jų:

- „Socialinių paslaugų įstaigų senyvo amžiaus asmenims infrastruktūros modernizavimas ir plėtra Šilalės rajono savivaldybėje“ – **366 495,00** Eur;
- „Visos dienos mokyklos erdvių sukūrimas ir pritaikymas Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijoje“ – **433 388,00** Eur;
- „Šilalės tvenkinio ir Šilalės pušyno bei aplinkinių teritorijų pritaikymas lankymui“ – **187 533,11** Eur;
- „Vandentvarkos paslaugų prieinamumo didinimas Šilalės rajono savivaldybėje“ – **31 432,31** Eur.

Tauragės rajono savivaldybės projektai (1)

Projekto Nr.	PP	Projekto pavadinimas	RPPI ES	Sutartis ES	Išmokėta ES	Sutaupymai projektuose
		Tauragės projektai iš viso:	**43 060 118,11**	**39 024 711,18**	**13 154 602,23**	**795 180,96**
27-206-P-0002	Aplinkos oro monitoringo stiprinimo PP	Tauragės rajono savivaldybės aplinkos oro monitoringo infrastruktūros plėtra ir visuomenės informavimas	340 000,00	317 656,23	288 873,92	22 343,77
	Darnaus judumo skatinimo Tauragės mieste PP	Viešojo transporto priemonių parko plėtra Tauragės mieste	700 000,00			
27-101-P-0001	Darnaus judumo skatinimo Tauragės mieste PP	Vientiso dviračių takų tinklo kūrimas integruojant bevariklį transportą į bendrą transporto sistemą Tauragės mieste	5 785 484,00	5 785 484,00	3 000 000,00	
27-103-P-0001	Darnaus judumo skatinimo Tauragės mieste PP	Viešojo transporto paslaugų prieinamumo didinimas Tauragės regione	543 624,00	543 624,00	120 000,00	
	Darnaus judumo skatinimo Tauragės mieste PP	Viešosios alternatyviųjų degalų įkrovimo ir (ar) papildymo infrastruktūros plėtra Tauragės mieste	70 000,00			
27-537-P-0001	Ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtros PP	Ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtra	287 725,00	284 908,10	236 634,53	2 816,90
27-505-P-0001	Kokybiškų visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumo didinimo PP	Prevencinių priemonių, stiprinančių visuomenės sveikatą bei psichologinę gerovę ir atsparumą stiprinimas Tauragės rajono savivaldybėje	170 000,00	170 000,00	121 615,74	
27-410-P-0001	Socialinio būsto ir socialinių paslaugų PP	Socialinio būsto fondo plėtra Tauragės rajono savivaldybėje	2 550 000,00	2 550 000,00	291 171,43	
27-404-P-0001	Socialinio būsto ir socialinių paslaugų PP	Socialinių paslaugų asmenims, turintiems intelekto ir (ar) psichikos negalią, plėtra Tauragės rajono savivaldybėje	432 950,77	432 950,77	22 721,87	
27-407-P-0001	Socialinio būsto ir socialinių paslaugų PP	Nestacionarių socialinių paslaugų plėtra Tauragės rajono savivaldybėje	452 081,31	452 081,31		
27-408-P-0001	Socialinio būsto ir socialinių paslaugų PP	Socialinių paslaugų įstaigų senyvo amžiaus asmenims infrastruktūros modernizavimas ir plėtra Tauragės rajono savivaldybėje	2 496 068,35	2 496 068,35	70 000,00	
27-411-P-0001	Socialinio būsto ir socialinių paslaugų PP	Grupinių gyvenimo namų, skirtų asmenims, turintiems intelekto ir (ar) psichikos negalią įrengimas Tauragės rajono savivaldybėje	284 960,93	284 960,93		
27-004-P-0001	Švietimo PP	Universalaus dizaino elementų ir kitų inžinerinių priemonių įrengimas Tauragės rajono savivaldybės BUM	103 734,00	103 733,70	53 017,19	0,30
27-005-P-0004	Švietimo PP	Negalią turintiems mokiniams ir kitiems mokiniams pavėžėti iki ir iš ugdymo įstaigos lengvai pritaikomų transporto priemonių įsigijimas Tauragės rajono savivaldybėje	190 213,00	190 193,04	159 314,64	19,96

Išmokėta 961 043,84 Eur ES lėšų projektams:

- „Ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtra“ – **1 818,49** Eur;
- „Socialinio būsto fondo plėtra Tauragės rajono savivaldybėje“ – **91 171,43** Eur;
- „Vandentvarkos paslaugų prieinamumo didinimas Tauragės rajono savivaldybėje – **868 053,92** Eur.

Tauragės rajono savivaldybės projektai (2)

Projekto Nr.	PP	Projekto pavadinimas	RPPI ES	Sutartis ES	Išmokėta ES	Sutaupymai projektuose
27-305-P-0001	Tauragė+ funkcinės zonos PP	Gamtos ir kultūros objektų pritaikymas lankymui Tauragės rajono savivaldybėje (Draudenių ežero pritaikymas lankymui; Tauragės dvaro parko pritaikymas lankymui)	2 330 644,00	2 330 644,00	2 213 434,69	770 000,00
27-317-P-0001	Tauragė+ funkcinės zonos PP	Balskų tvenkinio pritaikymas lankymui	501 319,00	501 319,00	28 000,00	
27-308-P-0001☑	Tauragės miesto tvarios plėtros PP	Viešųjų paslaugų prieinamumo gerinimas Tauragės vaikų reabilitacijos centre-mokykloje „Pušelė“ ir Tauragės meno mokykloje	2 044 966,00	2 044 966,00	2 044 965,98	0,02
27-309-P-0001	Tauragės miesto tvarios plėtros PP	Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos modernizavimas ir racionalus infrastruktūros panaudojimas	5 808 219,75	5 808 219,75	106 200,55	
27-310-P-0001☑	Tauragės miesto tvarios plėtros PP	Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos infrastruktūros ir aplinkinės teritorijos funkcionalumo didinimas	1 833 793,67	1 833 793,67	1 833 793,66	0,01
27-324-P-0001	Tauragės miesto tvarios plėtros PP	Tvarios aplinkos užtikrinimas prie Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos, urbanizuotose ir tankiai apgyvendintose, Zumpės tvenkinių teritorijose	4 017 829,33	4 017 829,33	1 502 855,77	
27-323-P-0001	Tauragės miesto tvarios plėtros PP	Jūros upės pakrantės teritorijos atgaivinimas ir pritaikymas daugiatikslėm naudojimui	2 898 225,00	2 898 225,00		
27-207-P-0001	Vandentvarkos paslaugų prieinamumo didinimo PP	Vandentvarkos paslaugų prieinamumo didinimas Tauragės rajono savivaldybėje	4 533 054,00	4 533 054,00	☑876 850,48	
27-205-P-0001	Žaliosios infrastruktūros plėtojimo PP	Tauragės miesto žaliosios infrastruktūros plėtojimas	1 445 000,00	1 445 000,00	160 964,63	
	Civilinės parengties stiprinimo PP	Civilinės parengties stiprinimas Tauragės rajone	1 480 226,00			
	Geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros saugumo didinimo PP	Geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros saugumo didinimas Tauragės rajone	1 000 000,00			
	Socialinio būsto ir socialinių paslaugų PP	Socialinio būsto fondo plėtra visiems jo laukiantiems asmenims (šeimoms) Tauragės rajono savivaldybėje	760 000,00			

Regionas - Skatinimo priemonės keliauti (ŽR)*** – projektu įgyvendinamos 3 veiklos:
1 – Skatinimo priemonių keliauti Tauragės regione parengimas („Žaliasis regionas“) – ES lėšos sutartyje 170 187,51 Eur, išmokėtos ES lėšos – 168 165,56 Eur;
2 – Veliuonos turizmo informacijos centro įrengimas (Jurbarko r. sav.) – ES lėšos sutartyje 945 916,12 Eur, išmokėtos ES lėšos – 0 Eur;
3 – Turistinių vartų į Tauragės regioną įrengimas (Tauragės r. sav.) – ES lėšos sutartyje 242 460,55 Eur, išmokėtos ES lėšos – 104 695,34 Eur.

☑ - projektas baigtas įgyvendinti.



Išmokėta 7 701,51 Eur ES lėšų – projektui „Skatinimo priemonių judėti parengimas ir įgyvendinimas bei viešojo transporto paslaugų prieinamumo didinimas Tauragė+ FZ“.

Regionas - Visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumo didinimas Jurbarko rajono ir Pagėgių savivaldybėse (JVSB)* - projektu įgyvendinamos 2 pažangos priemonių veiklos Jurbarke ir Pagėgiuose:
1 - Visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumo didinimas Jurbarko rajono ir Pagėgių savivaldybėse (VRM) – ES lėšos sutartyje - 505 750,00 Eur, išmokėta 73 441,39 Eur;
2 - Prevencinių priemonių, stiprinančių visuomenės sveikatą bei psichologinę gerovę ir atsparumą stiprinimas Jurbarko rajono ir Pagėgių savivaldybėse (SAM) – ES lėšos sutartyje - 329 032,00, išmokėta 24 304,65 Eur.

Regionas - Skatinimo priemonės investuoti (ŽR)** – projektu įgyvendinamos 2 veiklos:
1 – infrastruktūros plėtra Jurbarko mieste (Jurbarko r. sav.) – ES lėšos sutartyje 5 111 457,69 Eur, išmokėtos ES lėšos – 775 730,94 Eur;
2 – skatinimo investuoti priemonės („Žaliasis regionas“) – ES lėšos sutartyje 168 848,02 Eur, išmokėtos ES lėšos – 80 208,57 Eur.

Regionas - Skatinimo priemonės keliauti (ŽR)*** – projektu įgyvendinamos 3 veiklos:
1 – Skatinimo priemonių keliauti Tauragės regione parengimas („Žaliasis regionas“) – ES lėšos sutartyje 170 187,51 Eur, išmokėtos ES lėšos – 168 165,56 Eur;
2 – Veliuonos turizmo informacijos centro įrengimas (Jurbarko r. sav.) – ES lėšos sutartyje 945 916,12 Eur, išmokėtos ES lėšos – 0 Eur;
3 – Turistinių vartų į Tauragės regioną įrengimas (Tauragės r. sav.) – ES lėšos sutartyje 242 460,55 Eur, išmokėtos ES lėšos – 104 695,34 Eur.

2027 m. planuojama pasirašyti sutartis

Pažangos priemonė / projektai	Projektų skaičius	RPPl ES
Civilinės parengties stiprinimo PP	**3**	**3 200 530,00**
Jurbarkas *(2027 II)*		575 112,00
Šilalė *(2027 II)*		1 145 192,00
Tauragė *(2027 II)*		1 480 226,00
Geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros saugumo didinimo PP	**4**	**3 765 667,00**
Jurbarkas *(2027 II)*		1 575 000,00
Pagėgiai *(2027 II)*		590 667,00
Šilalė *(2027 II)*		600 000,00
Tauragė *(2027 II)*		1 000 000,00
Socialinio būsto ir socialinių paslaugų PP	**1**	**760 000,00**
Tauragė *(2027 II)*		760 000,00
IŠ VISO:	**8**	**7 726 197,00,**
